

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas




ÀMBIT D'OBRA

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

Xarxa actual que ha arribat al final de la seva vida útil

Falta de capacitat hidràulica

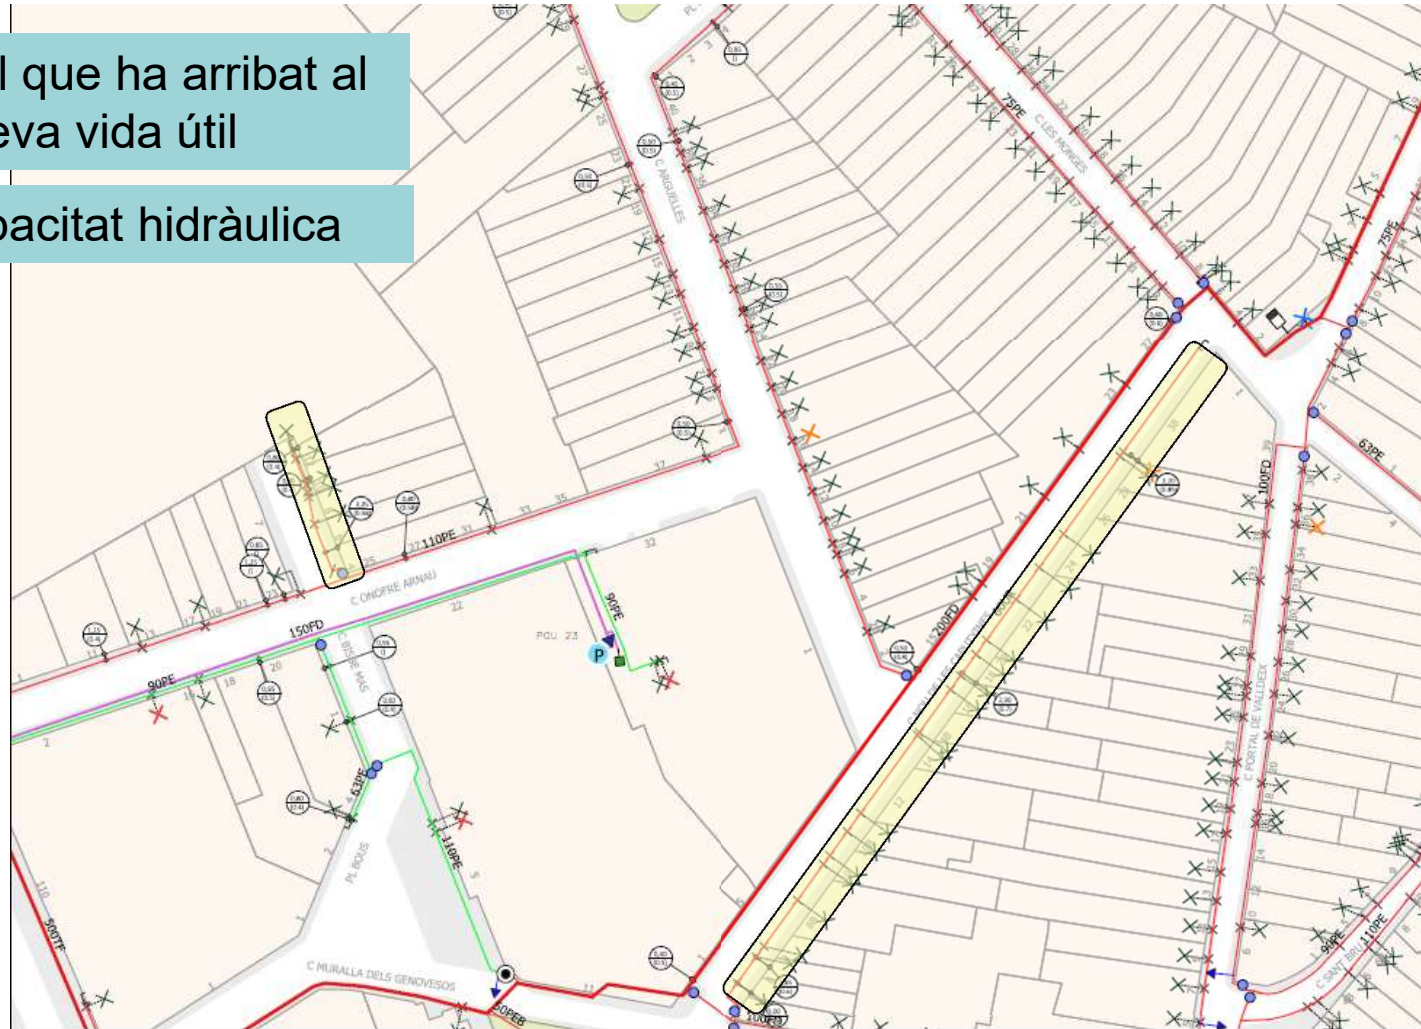


XARXA D'AIGUA POTABLE EXISTENT

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

Renovació de la xarxa existent per dues canonades de polietilè de diàmetre 90 mm i fosa dúctil de 100 mm

Millora cobertura d'hidrants i millora de la capacitat hidràulica de la xarxa

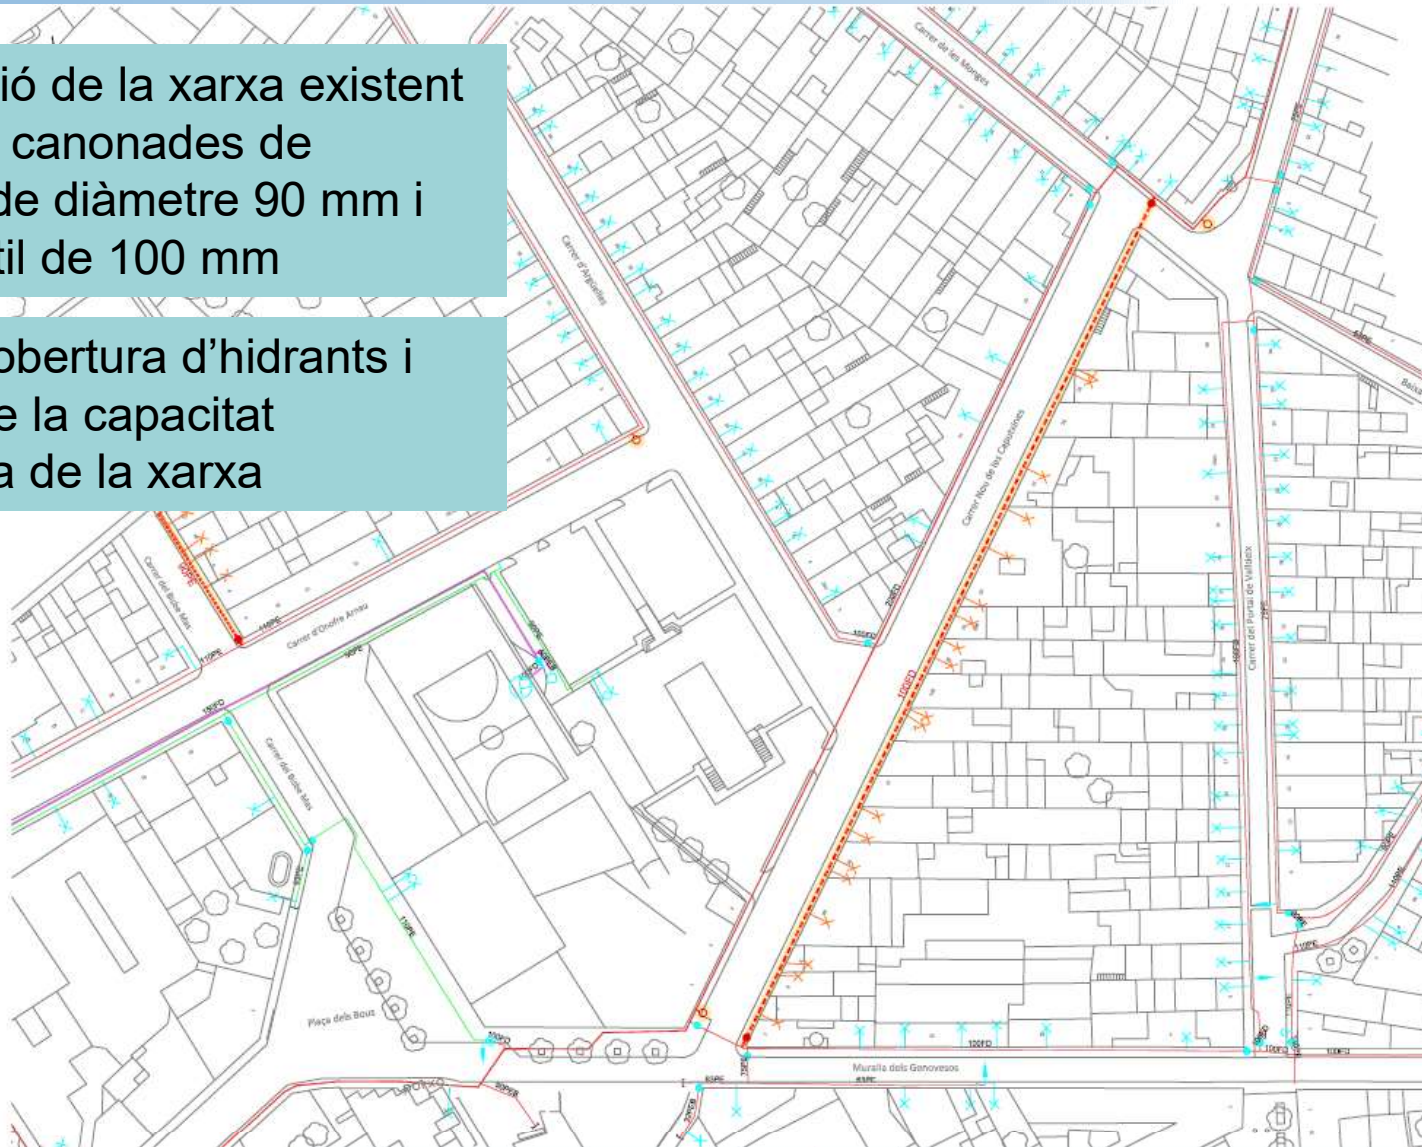


XARXA D'AIGUA POTABLE DE PROJECTE

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

Xarxa actual amb deficiències estructurals

Xarxa actual amb deficiències hidràuliques

Dèficit d'embornals

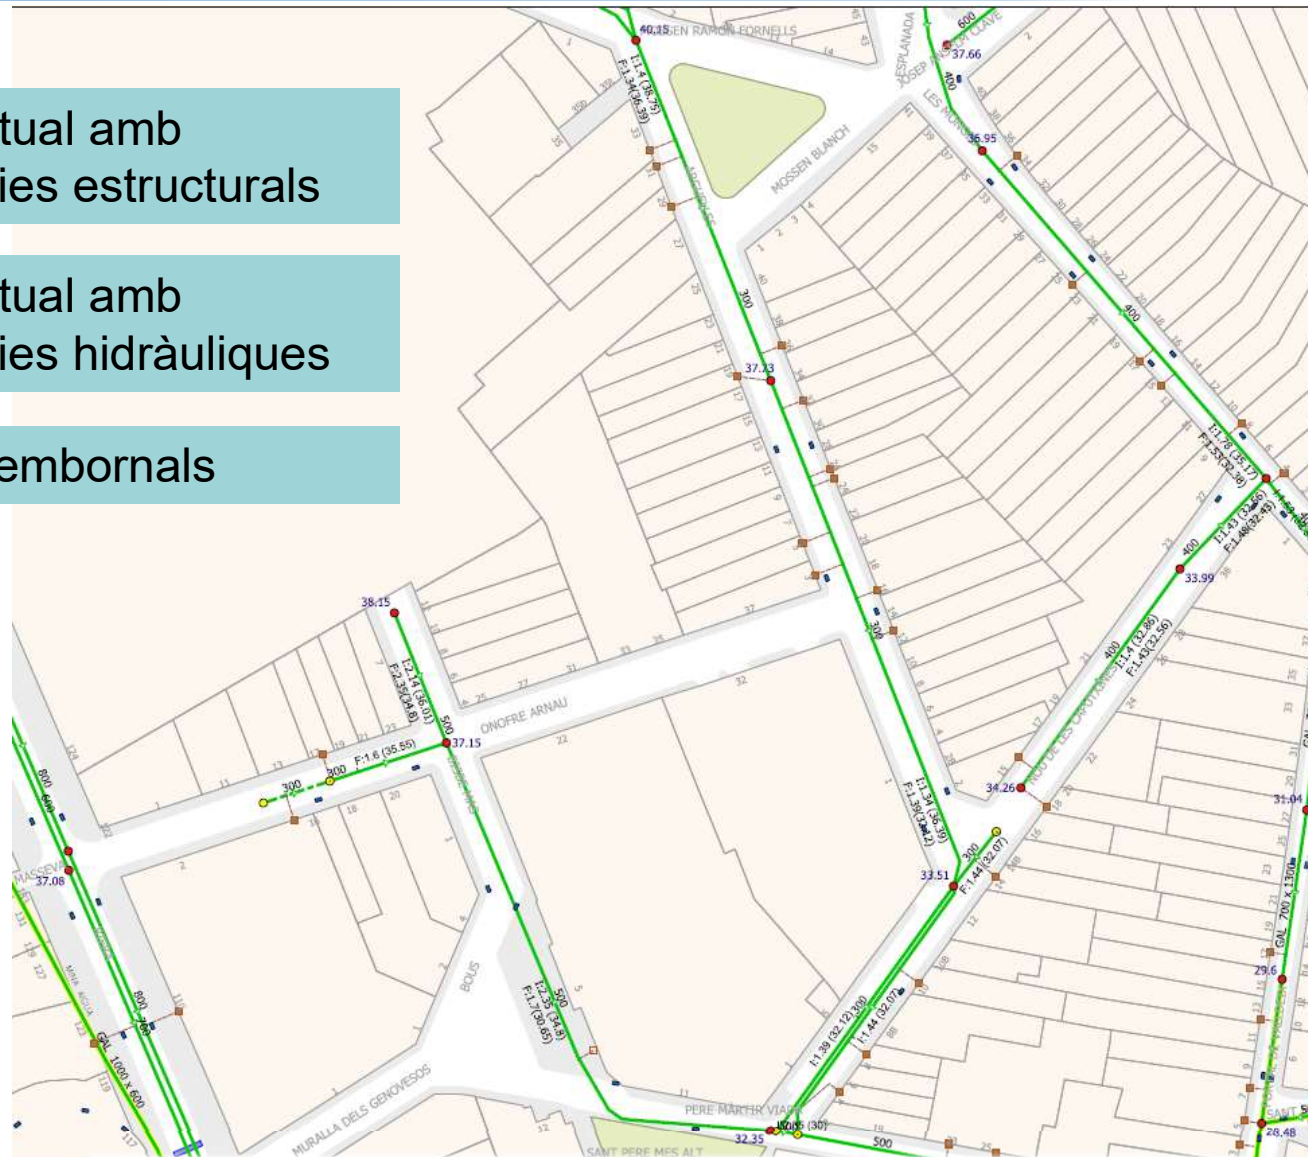


XARXA DE CLAVEGUERAM EXISTENT

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

Renovació xarxa existent per un tub de PVC de diàmetre 400 i 500 mm


Millora del drenatge superficial

Renovació del claveguerons

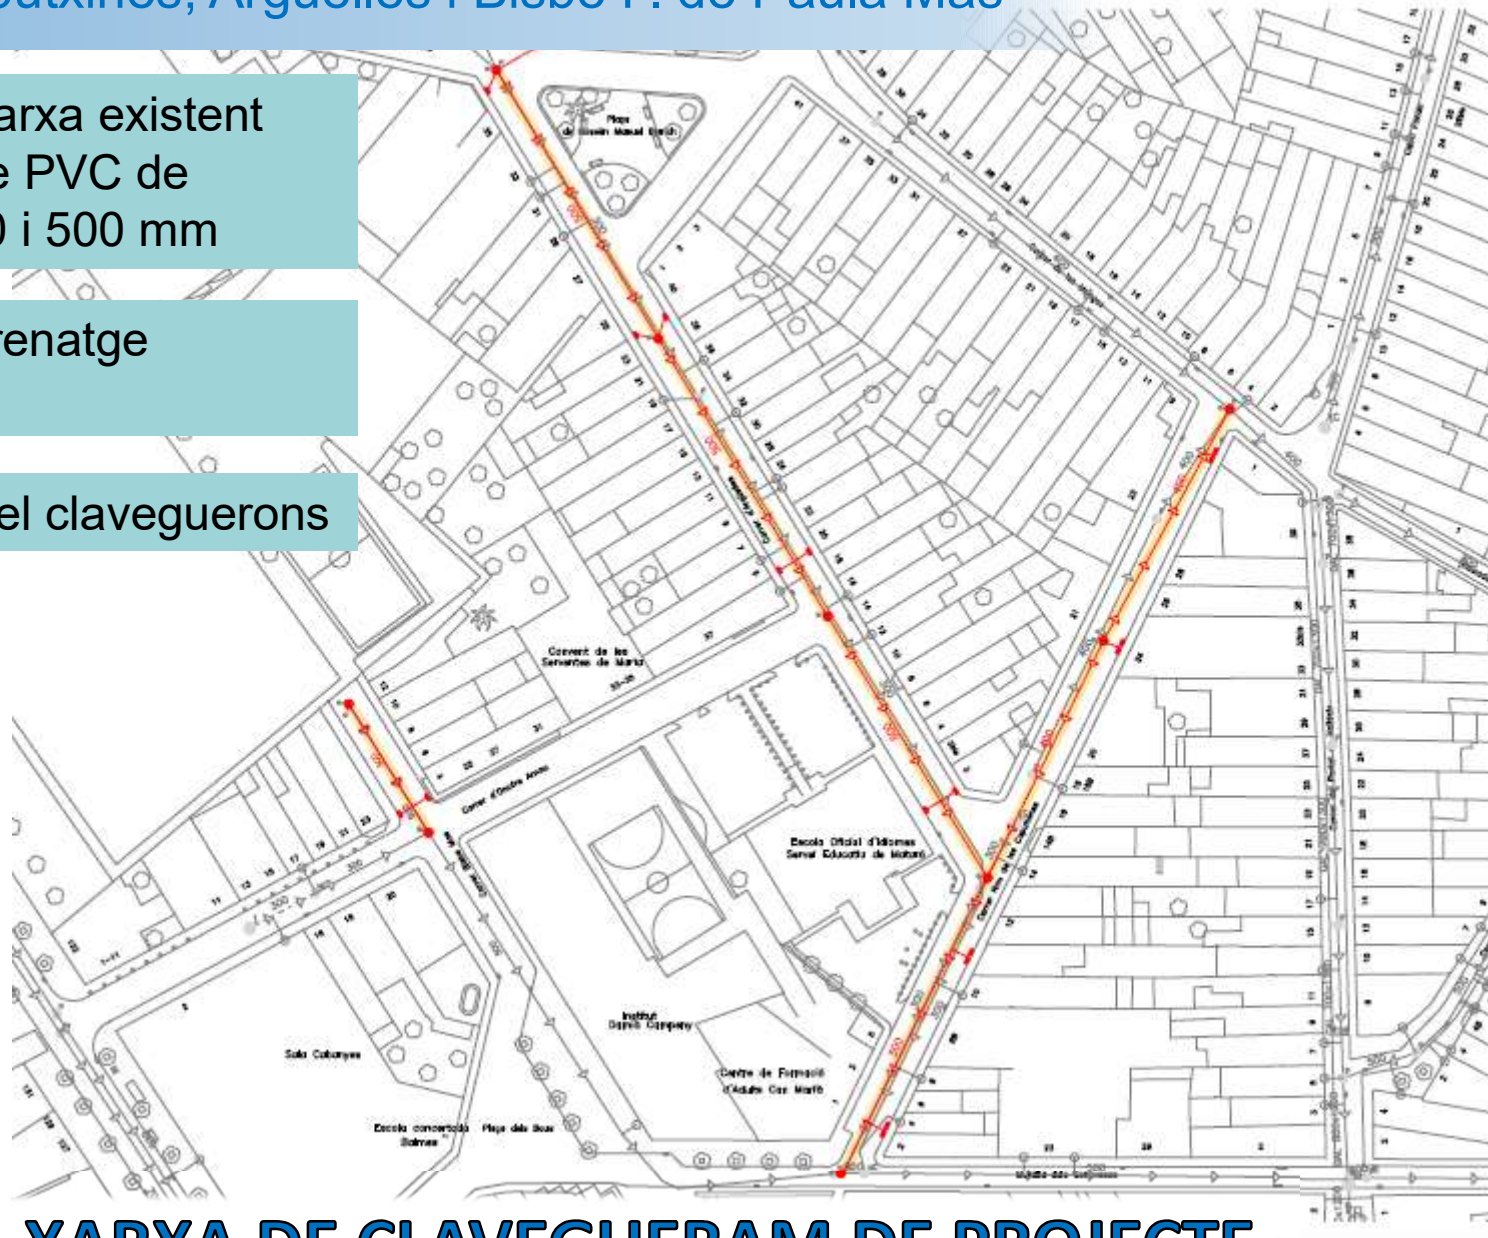

XARXA DE CLAVEGUERAM DE PROJECTE

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

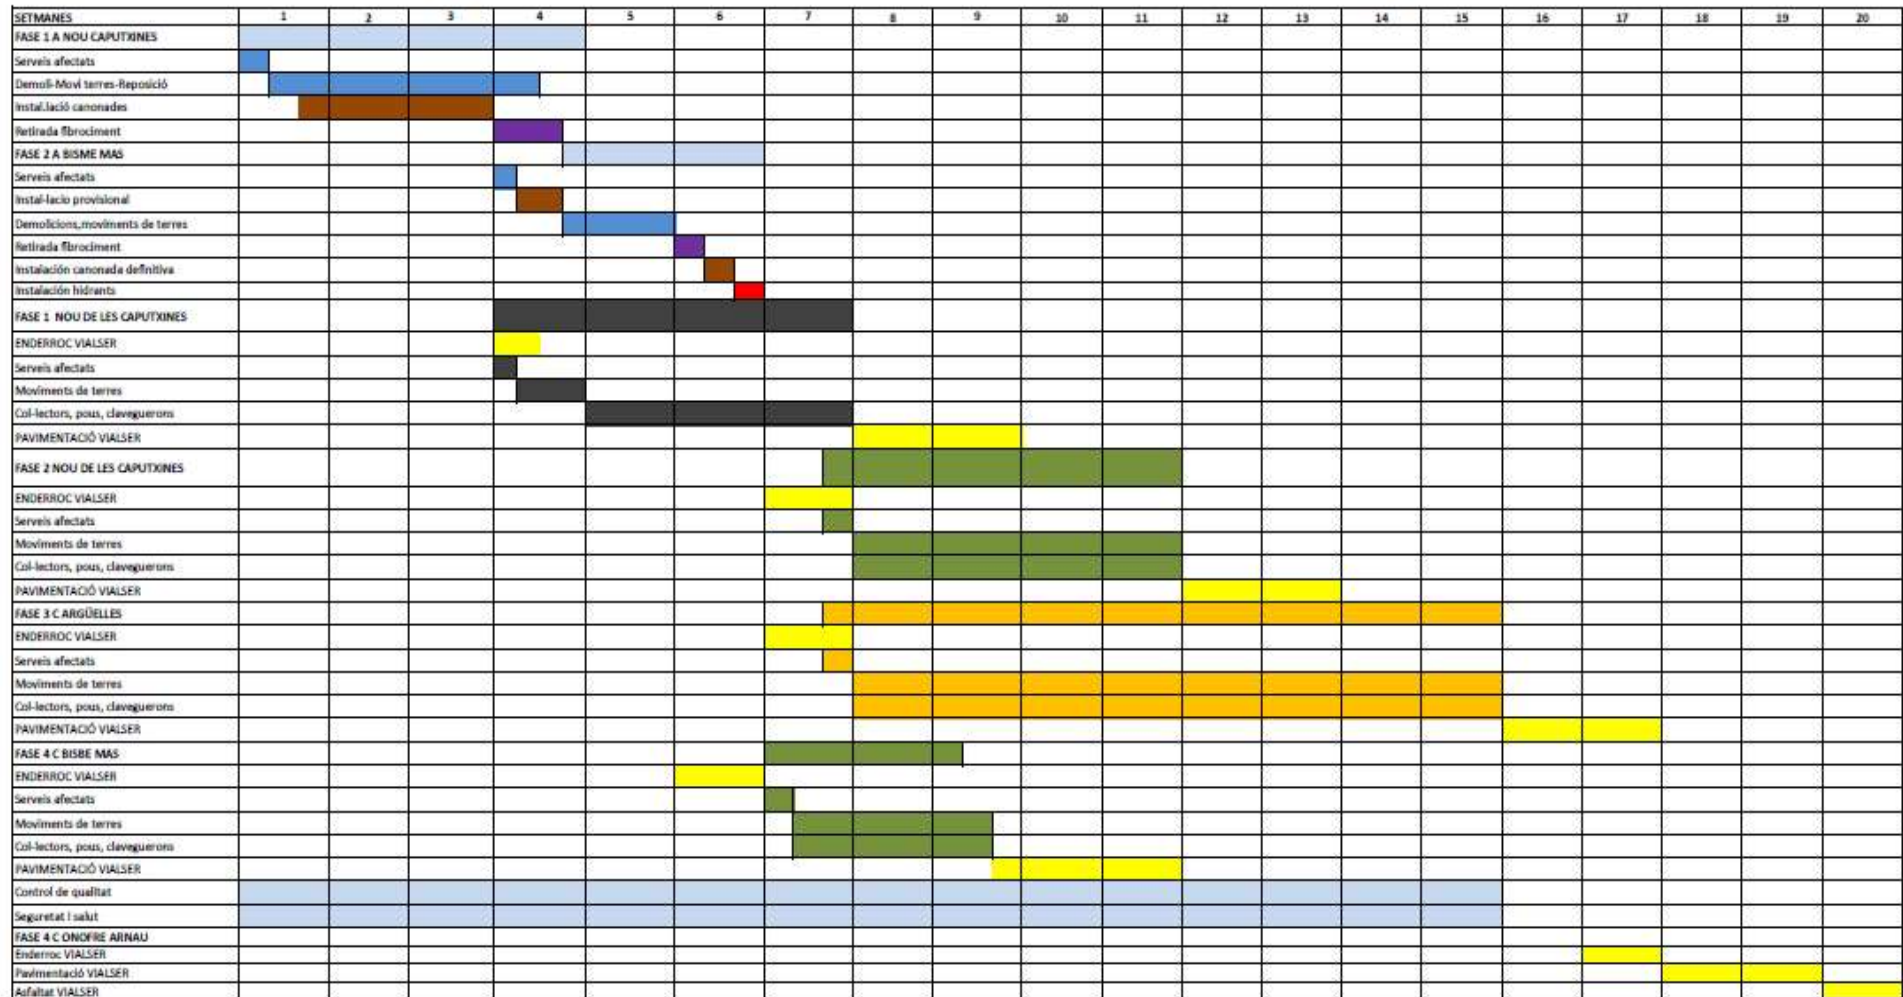

DURADA PREVISTA OBRES D'AIGUA I CLAVEGUERAM 15 SETMANES

TERMINI DE L'OBRA

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

A càrrec de l'Ajuntament: Pla de millora de paviments

Eliminació de la llamborda i nova pavimentació amb formigó i asfalt, incloent el carrer d'Onofre Arnau

Reparació voreres malmeses i millora de passos vianants



ÀMBIT NOVA PAVIMENTACIÓ

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

SETMANA 1 a SETMANA 3

Realització obra d'aigua potable



Afectació només a les zones d'estacionament. Es manté la circulació actual



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

SETMANA 4

Retirada de paviment i retirada tub fibrociment Nou de les Caputxines. Inici instal·lació provisional aigua Bisbe Mas



Afectació només a les zones d'estacionament



Tall del carrer Nou de les Caputxines entre Muralla dels Genovesos i Argüelles



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

SETMANA 5

Inici de la xarxa de clavegueram Nou de les Caputxines.
Instal·lació xarxa d'aigua Bisbe Mas



Afectació només a les zones d'aparcament.



Tall del carrer Nou de les Caputxines entre Muralla dels Genovesos i Argüelles



Tall de la Muralla dels Genovesos.

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA



Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

SETMANA 6 i 7

Xarxa de clavegueram Nou de les Caputxines. Retirada de paviment, retirada canonada fibrociment i xarxa de clavegueram Bisbe Mas



Afectació només a les zones d'estacionament



Tall del carrer Nou de les Caputxines entre Muralla dels Genovesos i Argüelles



Tall del carrer Bisbe Mas



EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

SETMANA 8 i 9

Retirada de paviment i retirada xarxa fibrociment Nou de les caputxines. Xarxa de clavegueram Nou de les Caputxines i Argüelles. Xarxa clavegueram Bisbe Mas



Tall del carrer Nou de les Caputxines i Argüelles



Tall del carrer Bisbe Mas

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA



Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

SETMANA 10 i 11

Retirada de paviment. Xarxa de clavegueram Nou de les Caputxines i Argüelles.



Tall del carrer Nou de les Caputxines i Argüelles



Zones amb afectació a l'estacionament

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA



Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

SETMANA 12 i 13


Xarxa de clavegueram Argüelles.



Tall del carrer Argüelles



Zones amb afectació a l'estacionament

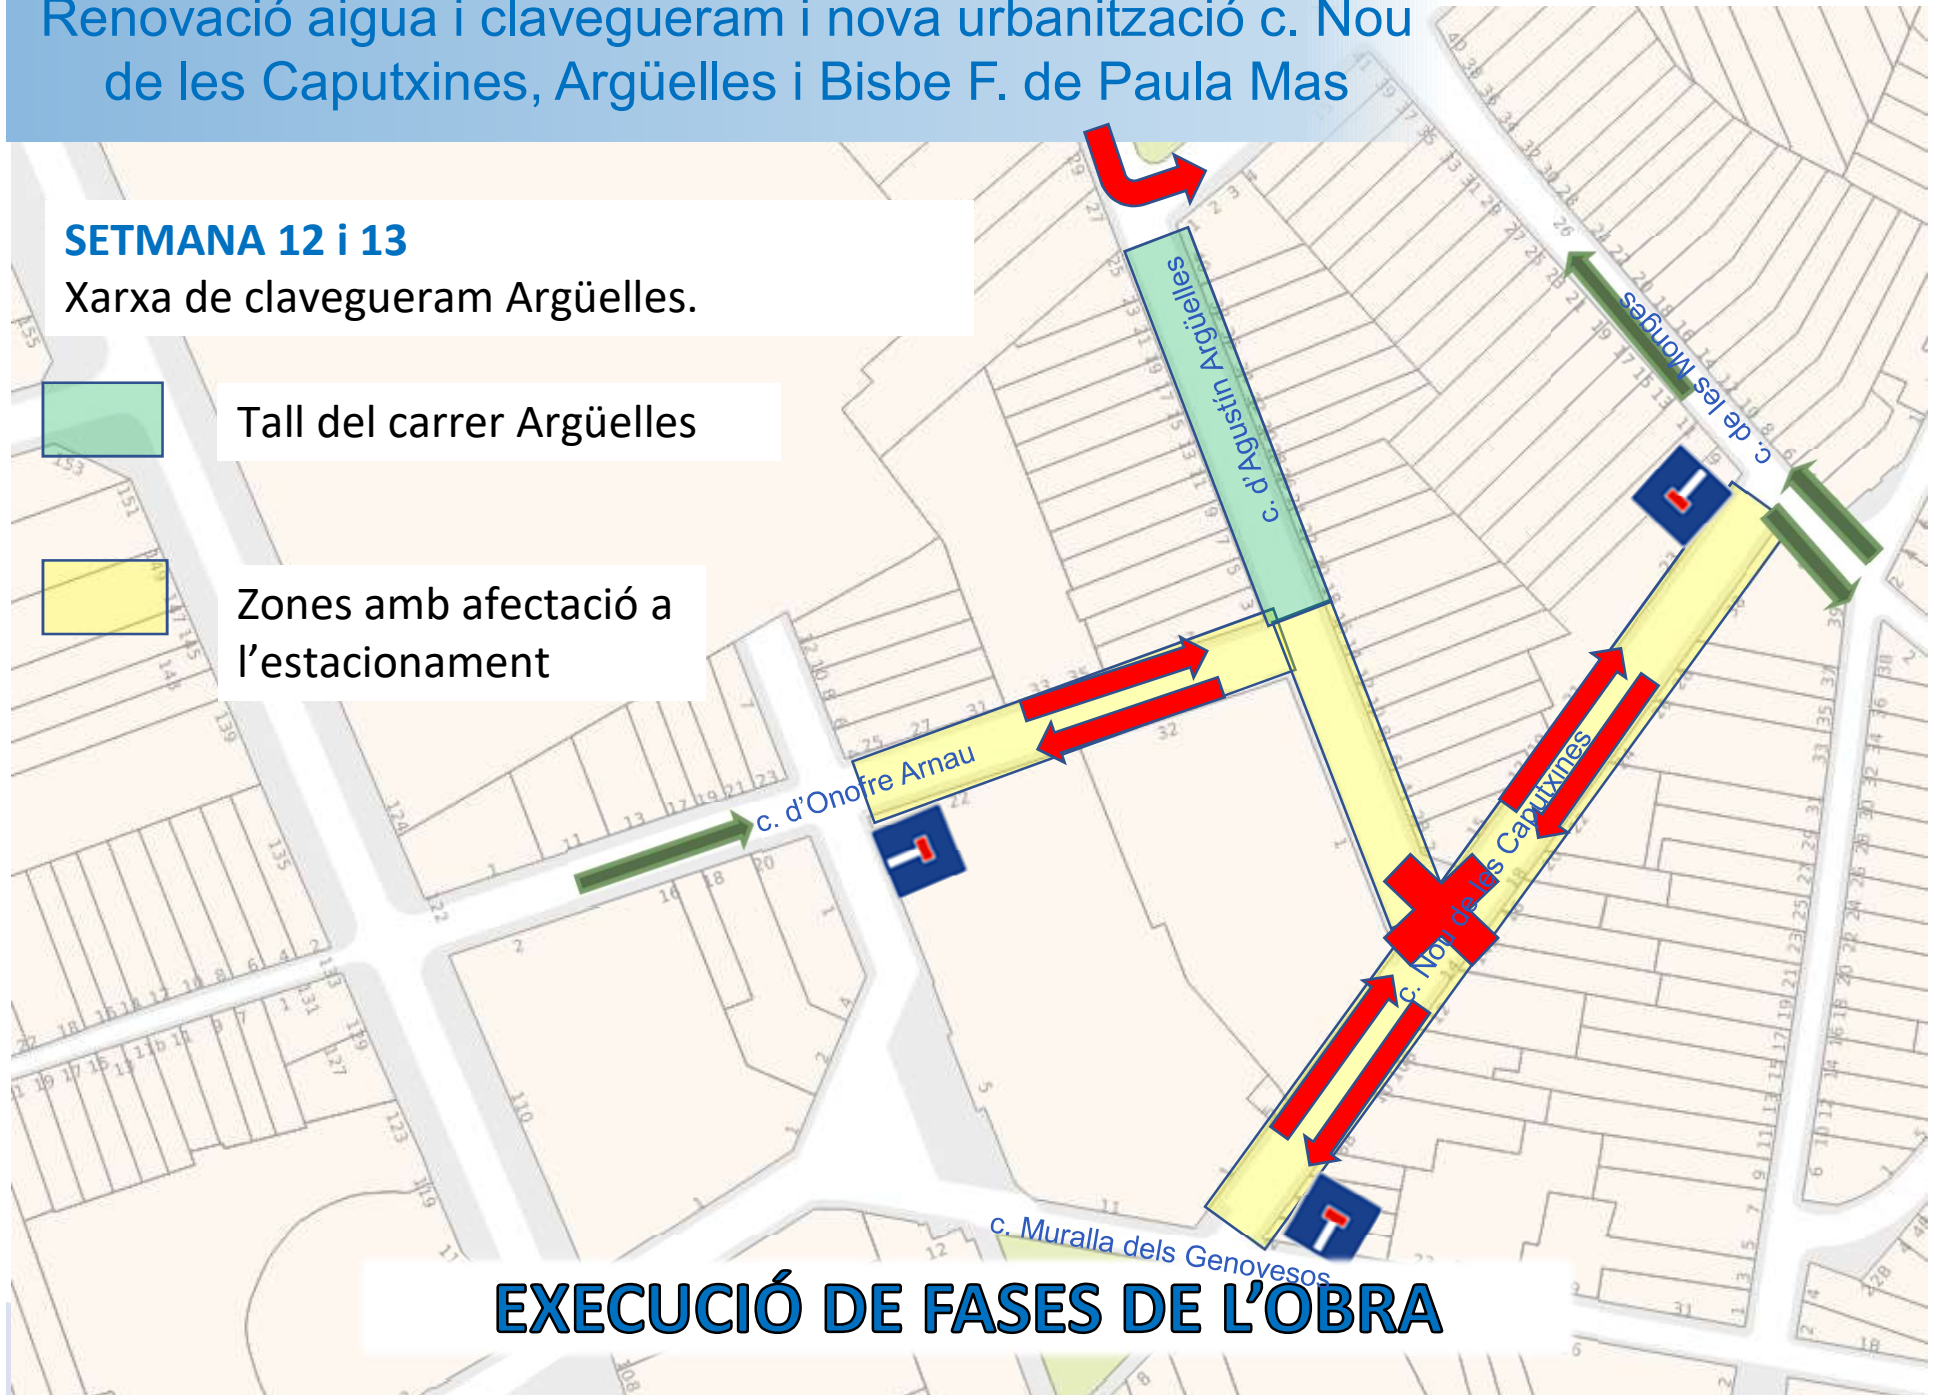


EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA

Projecte de l'aigua i del clavegueram del carrers Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas

SETMANA 14 i 15

Retirada de paviment i xarxa de clavegueram Argüelles.

 Tall del carrer Argüelles

 Zones amb afectació a l'estacionament

EXECUCIÓ DE FASES DE L'OBRA



AFFECTACIÓ A LA GESTIÓ DELS RESIDUS



Situació contenidors actualment




Reforç contenidors pròxims



Renovació aigua i clavegueram i nova urbanització c. Nou de les Caputxines, Argüelles i Bisbe F. de Paula Mas



Termini d'execució total	20 setmanes (amb paviments)
Import Obra Mecànica Aigua Potable	44.964,43 € (IVA inclòs)
Import adjudicació Obra Civil d'aigua i de clavegueram	483.714,02 € (IVA inclòs)
Import total obra AMSA	528.678,43 € (IVA inclòs)
Empresa adjudicatària Obra Civil d'aigua i clavegueram	Construcciones Garcia Cano e Hijos SA
Empresa adjudicatària obra paviments (Pla de millora de paviments de l'Ajuntament)	UTE construccions Deumal SA i Vialitat i Serveis SLU

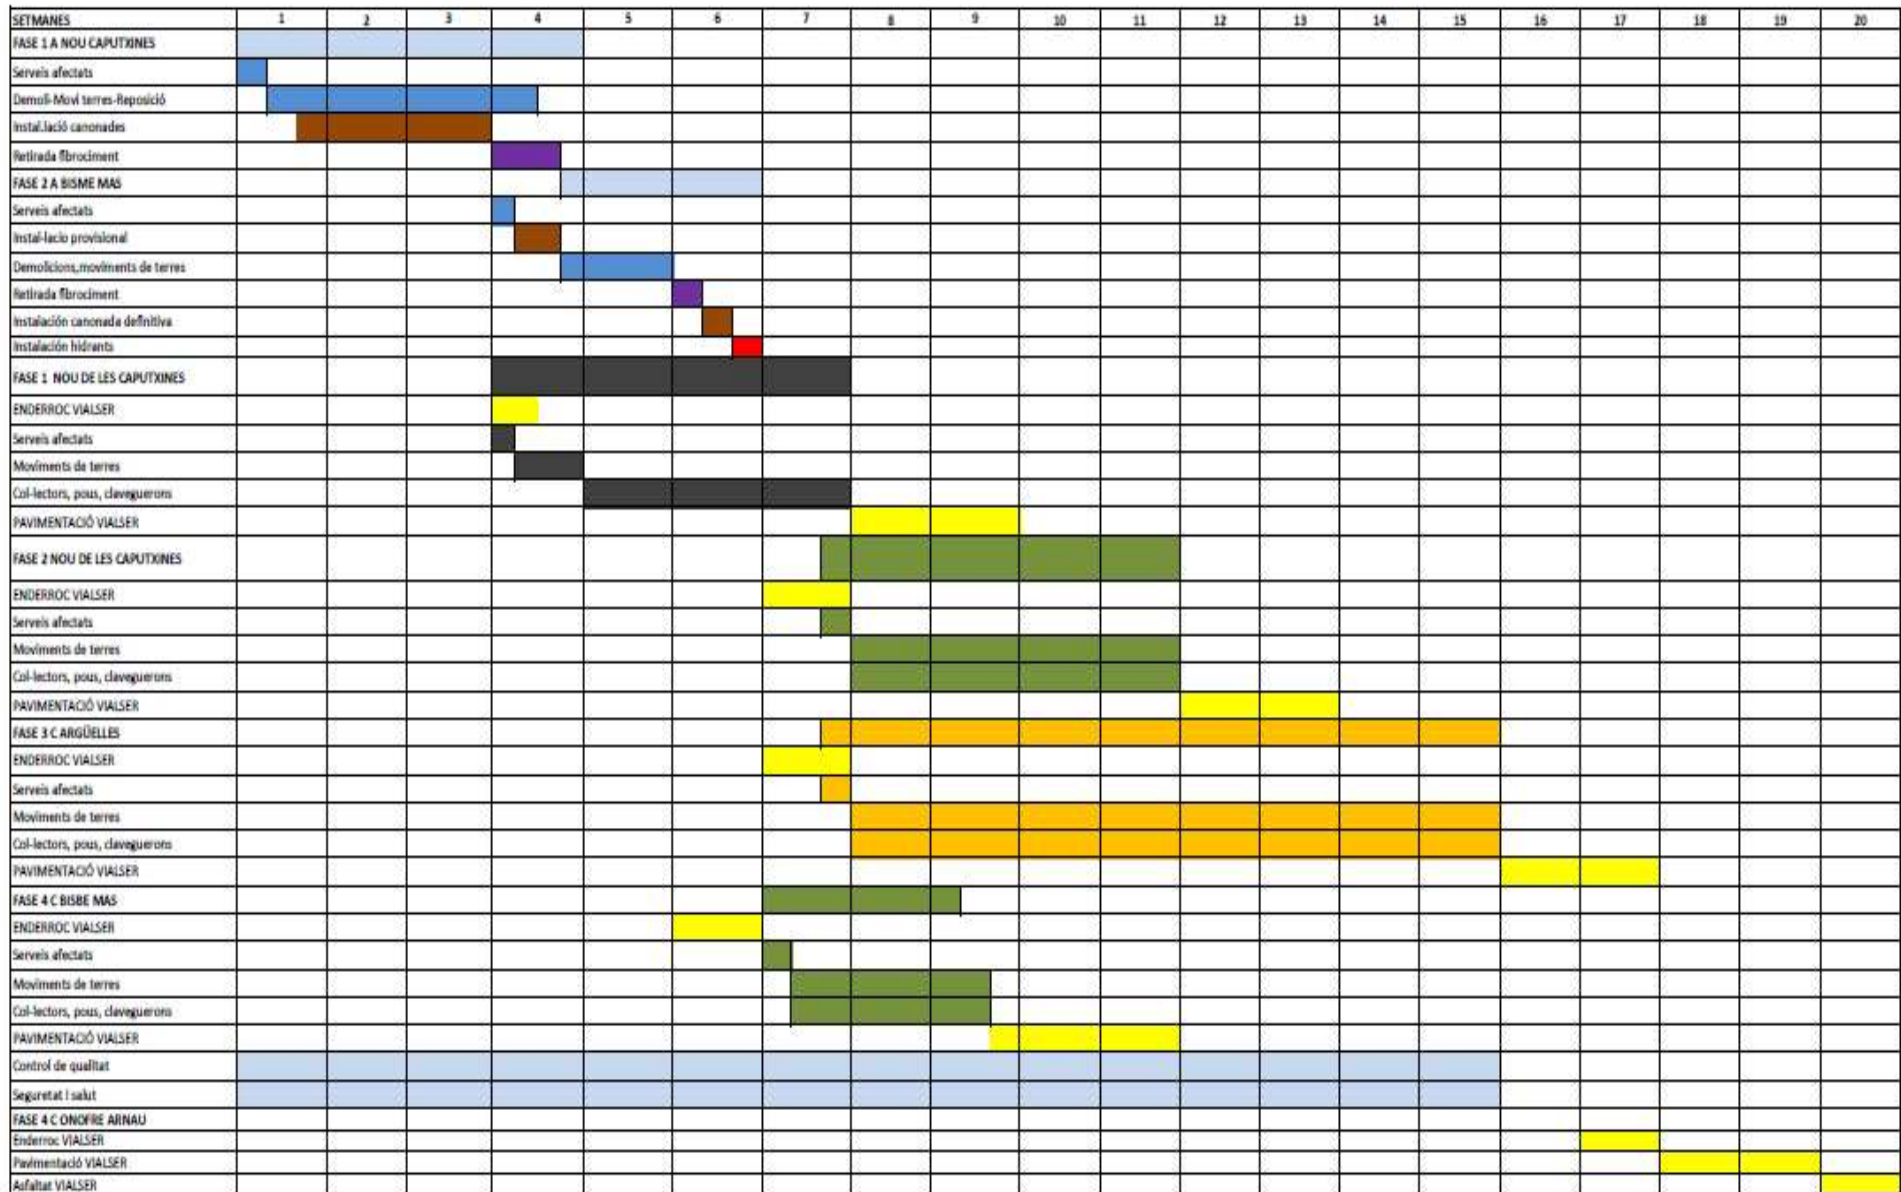

TERMINI GLOBAL DE L'OBRA
20 SETMANES

DATA INICI: 6 DE FEBRER
DATA FINALITZACIÓ: FINALS JUNY
